

Santiago, 18 de mayo de 2021

INFORME TECNICO

Objetivo.

El presente documento da cuenta de las actividades y resultados obtenidos en las labores de instalación del llamado de enfermería Responder 5 y además el sistema de R.T.L.S DE ELPAS.

Detalles.

Nombre Institución: F.A.L.P

Dirección: José Manuel Infante #805, Providencia, Sgto.

Fecha Ejecución labores: // 12-7-2022

Técnico Responsable: Tomas Cortez Aviles

Antecedentes

Sistema de llamado de enfermería RESPONDER 5 junto a sistema de R.T.L.S ELPAS se nos indicó que se mojaron producto de una filtración del techo, por lo cual se encontraban sin sistema en los pisos 5,4, y 3.

Labores realizadas

Se identificaron los problemas en los pisos mencionados anteriormente 5, 4, y 3, del cual se dejó operativo el piso 4 con equipos del piso 3, de los cuales se identificaron las siguientes fallas:

- Piso 5: conectores de tablero de sistema de llamado de enfermería sulfatados.
- Piso 4: cambio de conectores en llamado de enfermería sulfatados, corte en fuente y tarjeta de sistema Elpas.
- Piso 3: corte en BRC además de 2 fuentes de llamado de enfermería en corte, además se reemplazan conectores.
Cambio de fuente y tarjeta de sistema ELPAS.

Piso 5

Observaciones:

1.1.- Se realizó revisión y chequeo de gabinetes ELPAS Y RAULAND, Estos quedan 100% operativos, se realizan pruebas de funcionamiento de llamado de enfermería sin observaciones.

Piso 4.-


Observaciones:

1.1.- Se realizó revisión y chequeo de gabinetes ELPAS Y RAULAND.

Elpas: Se realiza cambio de tarjeta y fuente de alimentación.

Llamado de enfermería: se sube fuente de alimentación de piso 3 para dejar funcionando el sistema.

Estos quedan 100% operativos, se realizan pruebas de funcionamiento de llamado de enfermería sin observaciones.

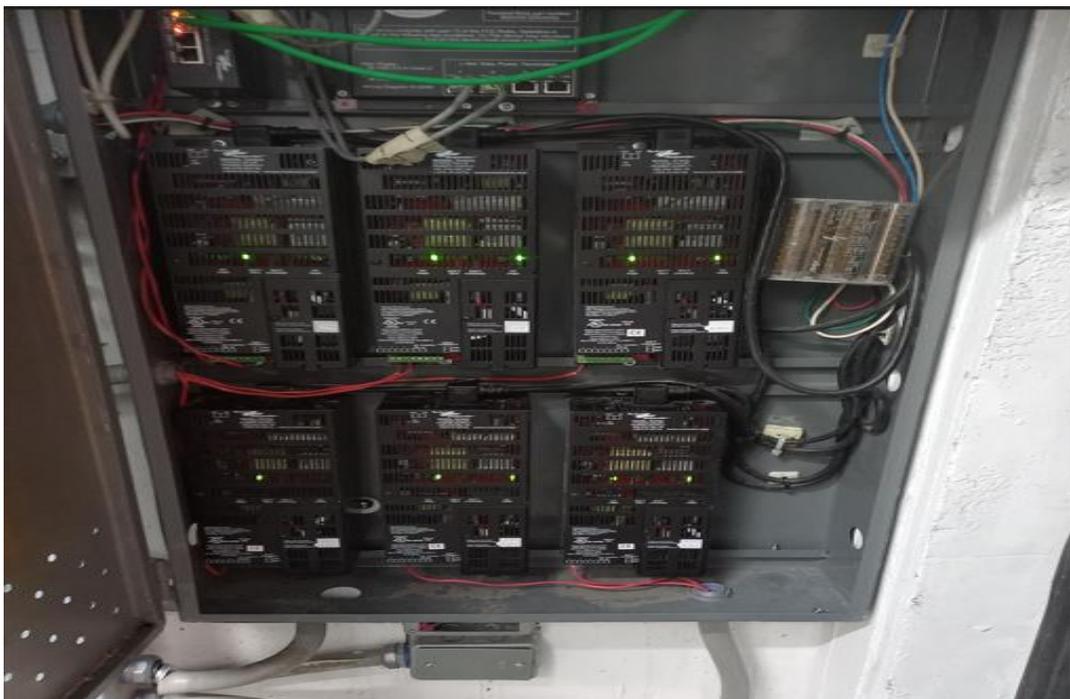



Piso 3.-

Observaciones:

1.1.- Se realizó revisión y chequeo de gabinetes ELPAS Y RAULAND.

Elpas: Se realiza cambio de tarjeta y fuente de alimentación.

Llamado de enfermería: Se realiza el cambio de 2 fuentes de alimentación, cabe mencionar que 1 de ellas es la que se reemplazó en piso 4.

Estos quedan 100% operativos, se realizan pruebas de funcionamiento de llamado de enfermería sin observaciones.





Tomas Cortez Avilés
Técnico
CENCOMEX S.A.
